



ATO RAGUSA AMBIENTE S.p.A.

In liquidazione

Sede: Centro Direzionale ASI Ed. Uffici 5° piano
97100 RAGUSA - Telefono 0932/666.519 fax 0932/666.516
Cap. Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F. 01221700881

COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL PUNTO 2.4.3. DEL D.LGS. 36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN CONTRADA POZZO BOLLENTE – VITTORIA (RG)

PROGETTO ESECUTIVO

I Progettisti

Dott. Chim. Fabio Ferreri (Geom.)

Dott. Arch. Roberto Lauretta

Dott. Ing. Giancarlo Dimartino

Collaborazione: Geom. Salvatore Marino – Sig.ra Etrusca Campailla

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Gaetano Rocca

| REV. | DATA | OGGETTO DELLA MODIFICA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|------------------------|---------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 20-04-2013 | PRIMA EMISSIONE | ML | WF | FF |

CRONOPROGRAMMA ART 40 D.P.R. 207/2010

Data:

Visti ed approvazioni

Comune di VITTORIA


Provincia di RAGUSA

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL D.LGS.36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA POZZO BOLLENTE - VITTORIA (RG)

COMMITTENTE: ATO Ragusa Ambiente

Ragusa,

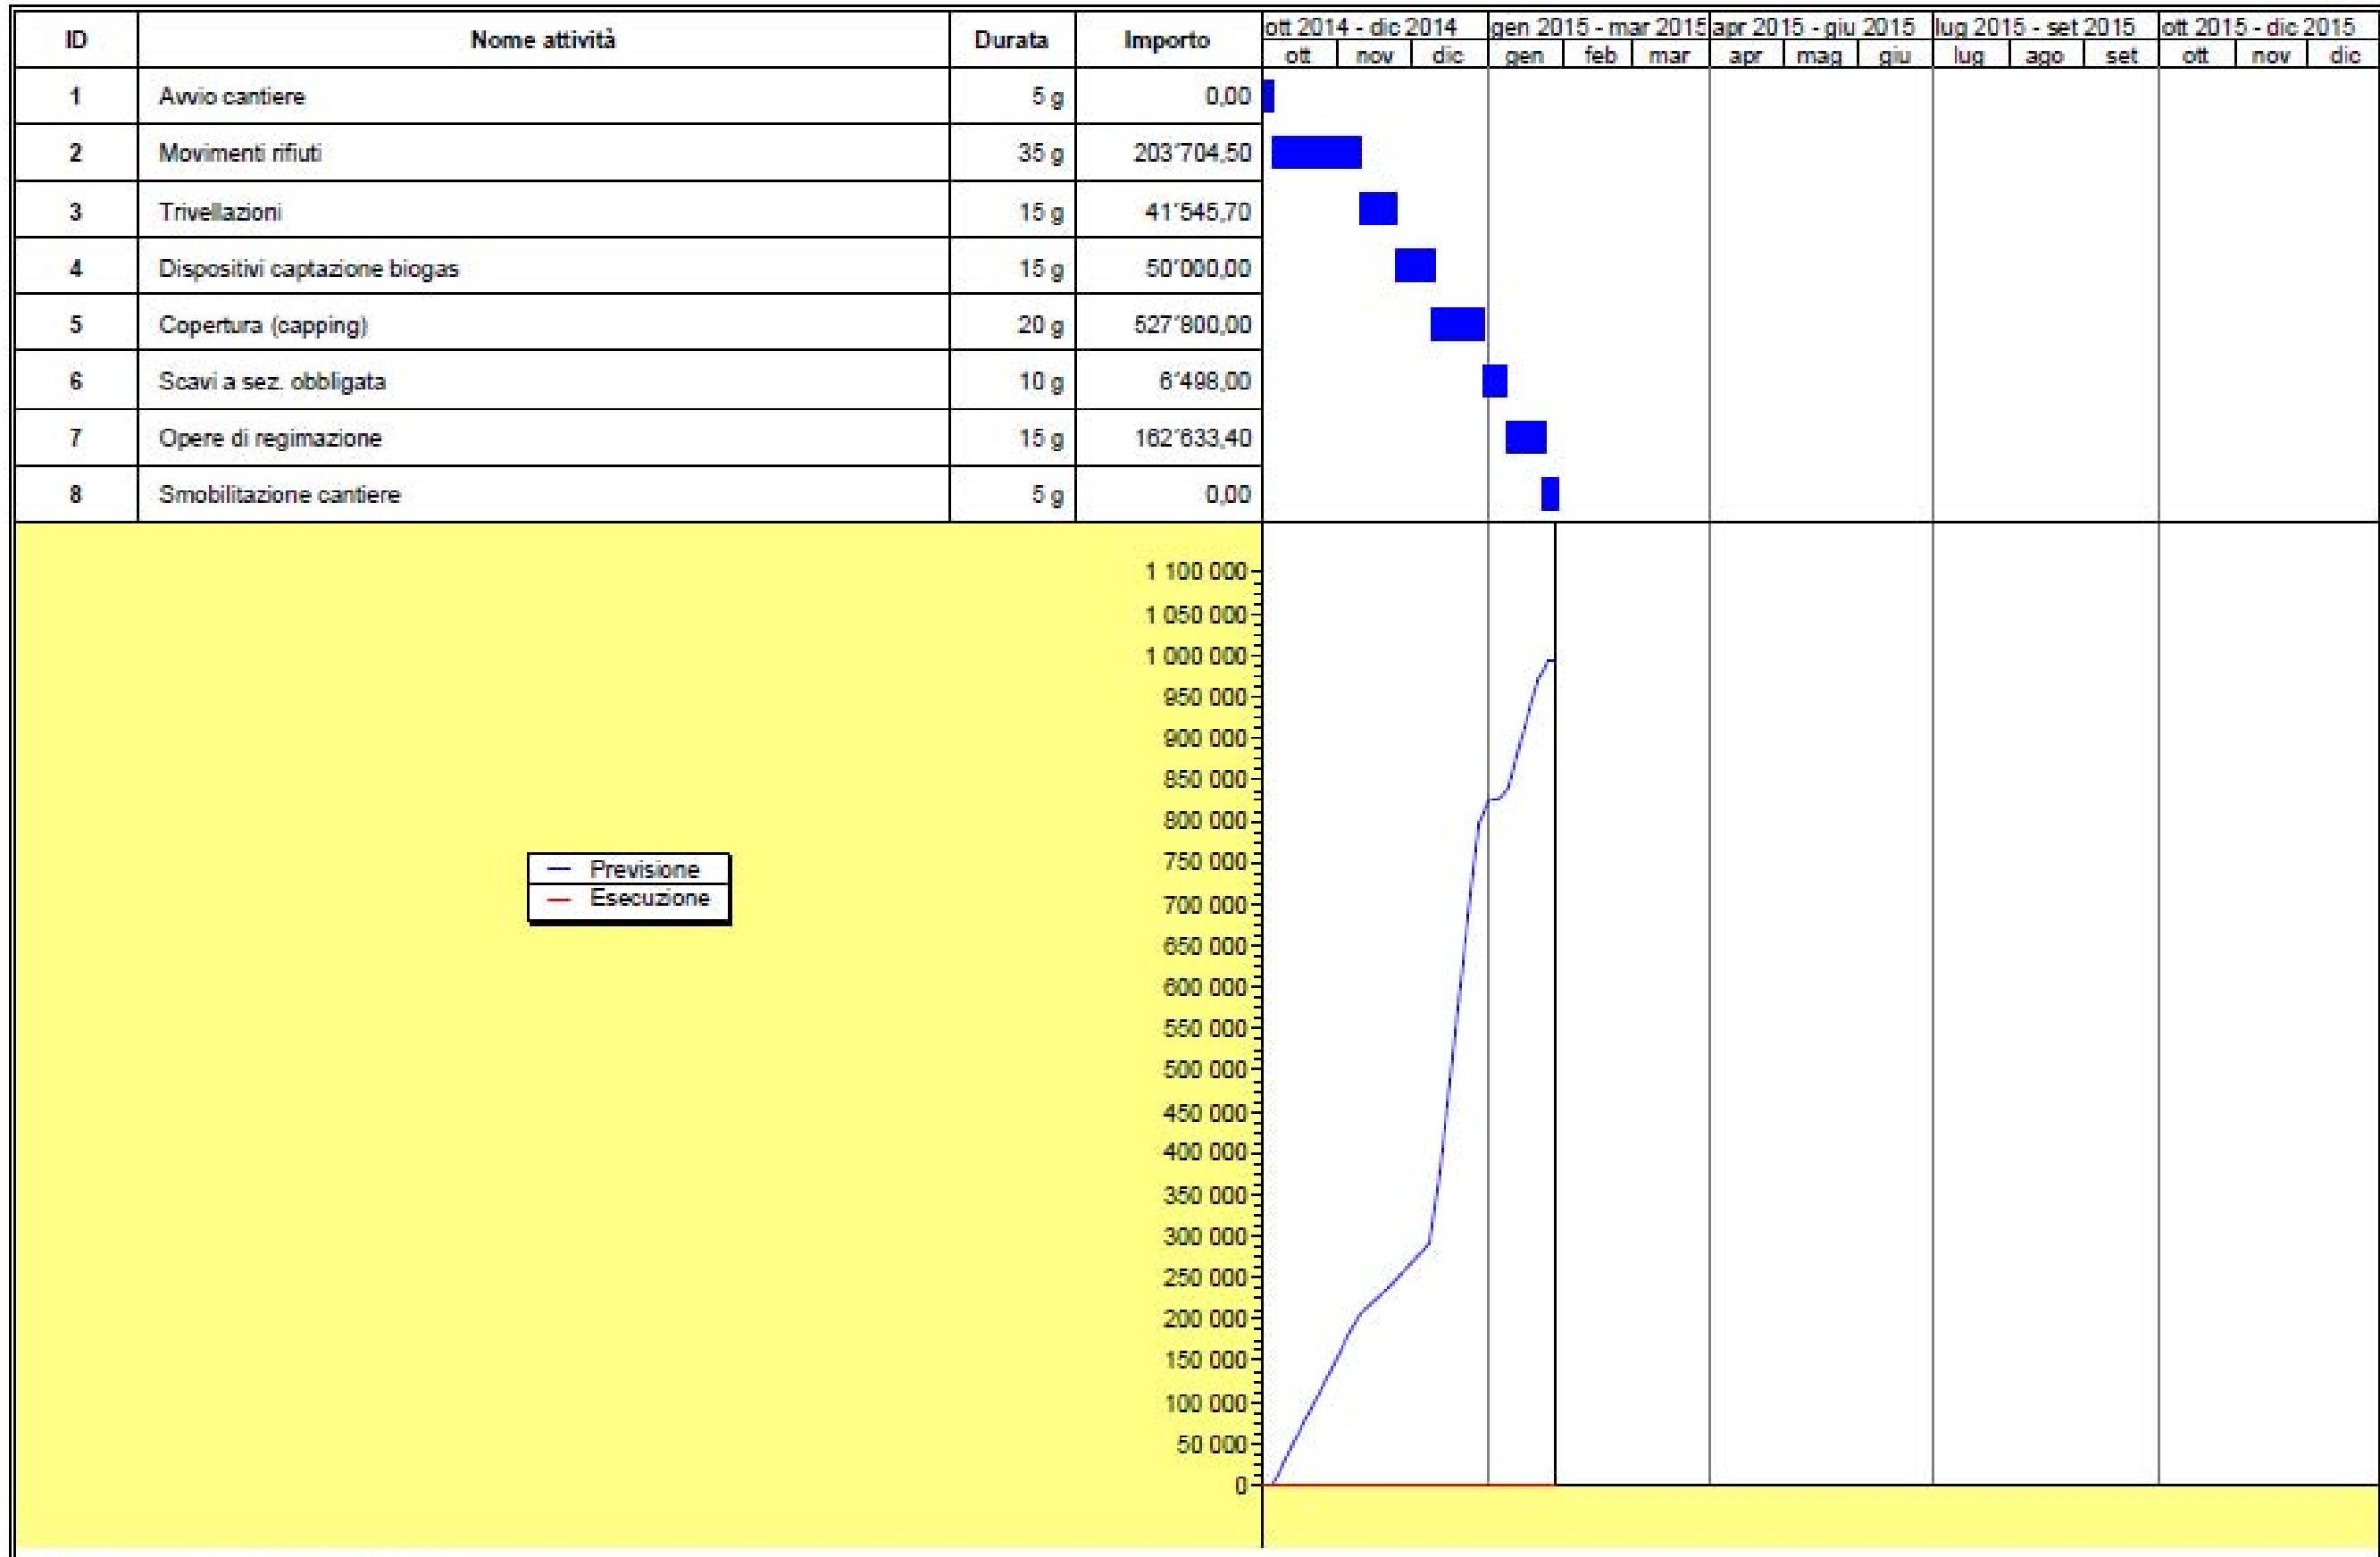

Comune di VITTORIA

Provincia di RAGUSA

Tabella Attività

OGGETTO: COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL D.LGS.36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN C.DA POZZO BOLLENTE - VITTORIA (RG)

COMMITTENTE: ATO Ragusa Ambiente

Ragusa,

| ATTIVITA' | PREVISTO | | Inizio | Fine | GIORNI | |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|--------|------|
| | euro | (%) | | | Lav. | Tot. |
| Avvio cantiere | 0,00 | 0,00 | 01/10/2014 | 05/10/2014 | 5 | 5 |
| Movimenti rifiuti | 203'704,50 | 20,53 | 06/10/2014 | 09/11/2014 | 35 | 35 |
| Trivellazioni | 41'545,70 | 4,19 | 10/11/2014 | 24/11/2014 | 15 | 15 |
| Dispositivi captazione biogas | 50'000,00 | 5,04 | 25/11/2014 | 09/12/2014 | 15 | 15 |
| Copertura (capping) | 527'800,00 | 53,20 | 10/12/2014 | 29/12/2014 | 20 | 20 |
| Scavi a sez. obbligata | 6'498,00 | 0,65 | 30/12/2014 | 08/01/2015 | 10 | 10 |
| Opere di regimazione | 162'633,40 | 16,39 | 09/01/2015 | 23/01/2015 | 15 | 15 |
| Smobilitazione cantiere | 0,00 | 0,00 | 24/01/2015 | 28/01/2015 | 5 | 5 |
| Ragusa, | | | | | | |
